


14 этаж

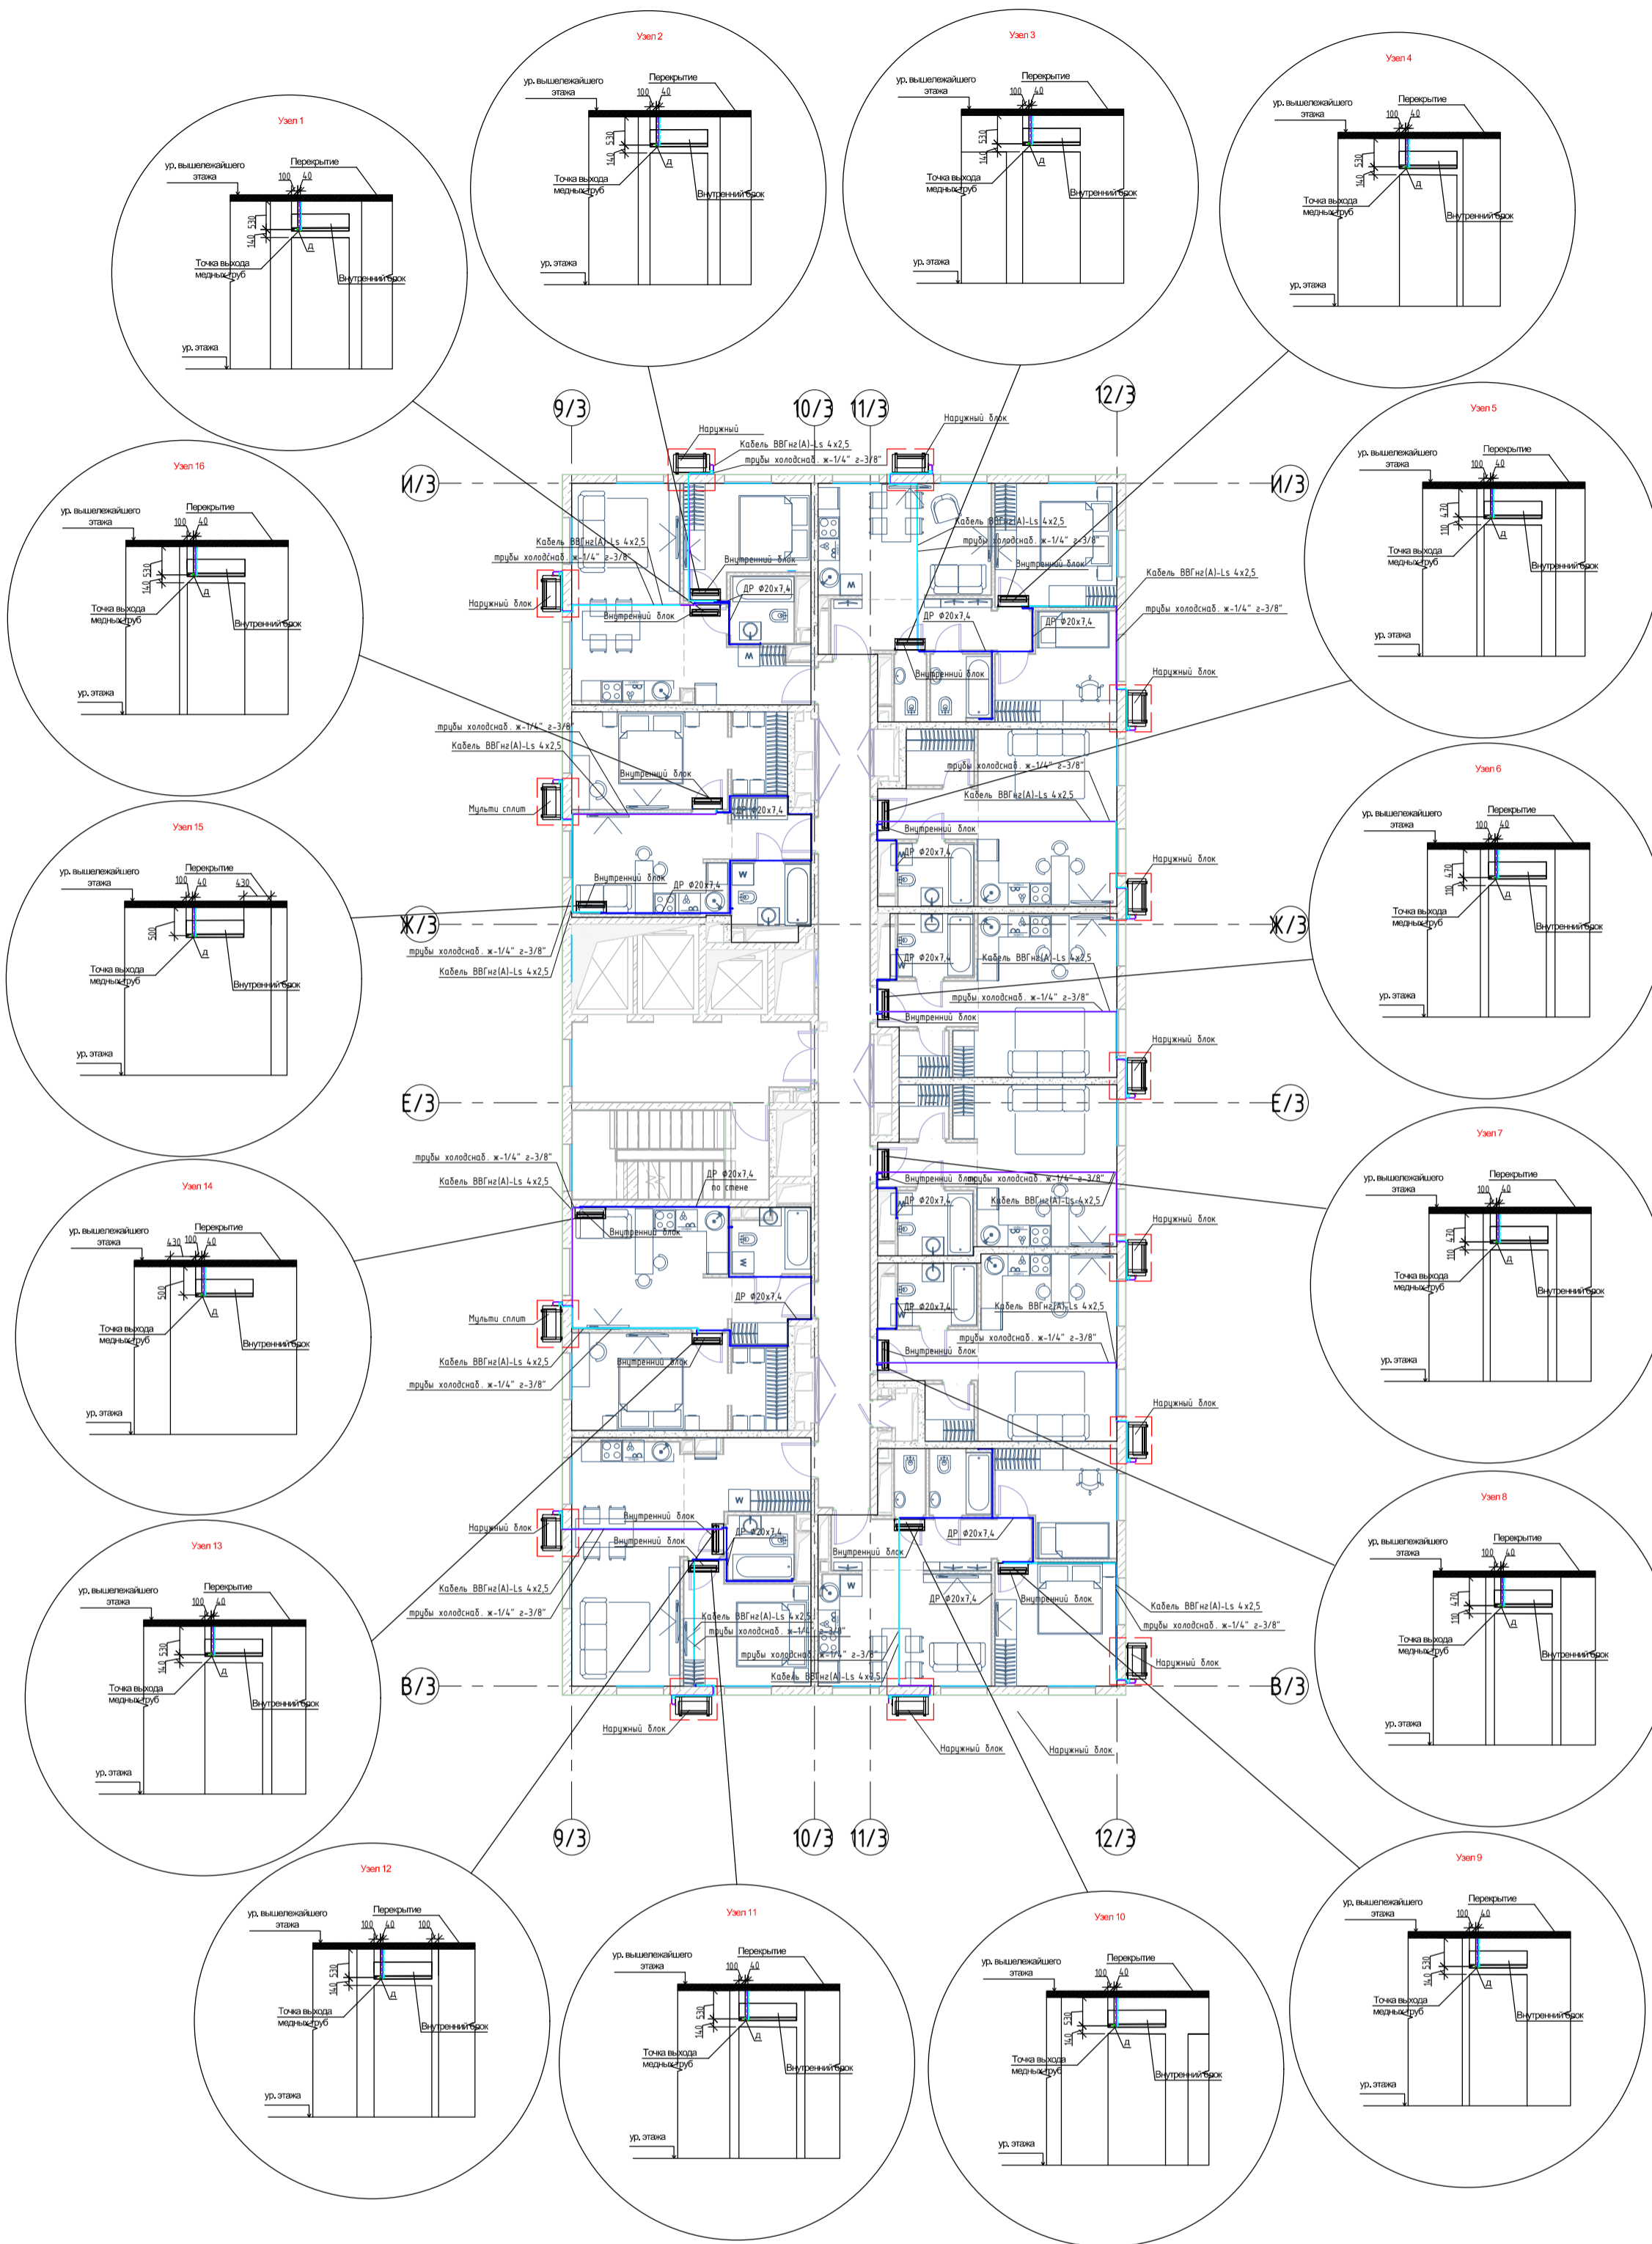

Кондиционирование. Объем выполненных работ на 1 кв

Код сметного расчета	Наименование (рус.)	Ед.	Объем Стиль "Классический" 51шт	Объем Стиль "Современный" 98шт	Объем Стиль "Лофт" 50шт
7.01.01.01.01	Штробление стен под разводку трасс кондиционирования (в случае необходимости)	м.п	13,82	13,16	13
7.01.01.01.02	Прокладка трасс кондиционирования (две медные трубки + кабель питания + кабель связи + дренажные трубки) от квартирного щита до места установки наружного блока или до места установки внутреннего блока, с прокладкой трассы между ними, дренажных трасс от места установки внутреннего блока до стояка канализации с подключением для безнапорного отведения дренажа. Местоположение внутренних блоков всегда над дверным проемом. На все стандартные квартиры 2 внутренних блока для кухни-гостиной и мастер-спальни. Для очень больших квартир (4-шки, 5-ки) с двумя мастер-спальнями - 3 внутренних блока) Труба медная Ø6,35	Компл.	1	1	1

Условные обозначения:

- - Предъявляемые к освидетельствованию смонтированные медные трубы с теплоизоляцией
- - Предъявляемые к освидетельствованию смонтированные полипропиленовые трубы с теплоизоляцией
- - Не предъявляемые к освидетельствованию межблочный кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм (электропроводку выполняет ООО "ЭМГ ИНЖИНИРИНГ")

108/18-ГК-КЗ-ХС

Многофункциональный административно-жилой комплекс в составе ТПУ "Дмитровская" по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Адамалиев О				25.06.21
Разработал	Гюлю Корай				25.06.21

Корпус 3. Системы кондиционирования

Стация	Лист	Листов
ИД	14	

План 14 этаж



Формат А2
